



Управление образования Ленинск-Кузнецкого городского округа
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение
«Детский сад №39»

**«Оптимизация процесса размещения
новостей на сайте, в мессенджерах и
социальных сетях»**

Паспорт проекта

«Наименование проекта»



ПАСПОРТ бережливого проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №39»
Оптимизация процесса размещения новостей на сайте, в мессенджерах и социальных сетях

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №39

Л.Л. Кутькина
Л.Л. Кутькина



<p>Общие данные: Заказчик: заведующий МБДОУ №39 Процесс: размещение новостной информации Границы процесса: С момента поручения о составлении новостей информации до размещения на сайте, в мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения Руководитель бережливого проекта: старший воспитатель Румынина М.В. Команда бережливого проекта: Кольчурина И.Ю., Потягайло И.В.-воспитатели</p>	<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Временные потери при согласовании текста новостей. 2. Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения. 3. Разнотипное оформление текстовой информации. 									
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" data-bbox="481 982 1182 1168"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, единицы измерения</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сократить временные затраты при подготовке и размещении новостной информации на сайте, мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения</td> <td>3 часа</td> <td>44 минуты</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Экономия времени 2. Отсутствие лишней информации 3. Размещение актуальных новостей без задержки 4. Создание единого стиля 	Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Сократить временные затраты при подготовке и размещении новостной информации на сайте, мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения	3 часа	44 минуты				<p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта проекта 20.03.2023г. – 24.03.2023г. 2. Картирование текущего состояния (с 27.03.2023 г.- 14.04.2023г.) 3. Анализ проблем и потерь (с 17.04.2023г. – 26.04.2023г.) 4. Составление карты целевого состояния (с 27.04.2023–2.05.2023г.) 5. Разработка плана мероприятий (с 3.05.2023г. – 19.05.23г.) 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с 22.05.2023г.–29.05.2023г) 7. Внедрение улучшений (с 30.05.2023г. –21 .06.2023г.) 8. Мониторинг результатов (с 22.06.2023г. – 26.06.2023г.) 9. Закрытие проекта 27.06.2023г – 3.07.2023г.) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (3.07.2023г.– 5.07.2023г)
Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сократить временные затраты при подготовке и размещении новостной информации на сайте, мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения	3 часа	44 минуты								

Паспорт проекта

Общие данные



Заказчик: заведующий МБДОУ № 39 - И.Л. Кутькина

Границы процесса: С момента поручения о составлении новостей информации до размещения на сайте, в мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения.

Дата начала проекта: 20.03.2023г

Дата окончания проекта: 05.07.2023г

Команда проекта



Румынина Марина Владимировна, старший воспитатель – руководитель проекта



Кольчурина И.Ю.- воспитатель



Потягайло И.В. - воспитатель

Паспорт проекта

Обоснование

1. Временные потери при согласовании текста новостей.
2. Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения.
3. Разнотипное оформление текстовой информации.

Паспорт проекта

Цель		
Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сократить временные затраты при подготовке и размещении новостной информации на сайте, мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения	3 часа	44 мин
Эффекты		
1. Экономия времени 2. Отсутствие лишней информации 3. Размещение актуальных новостей без задержки 4. Создание единого стиля		

Паспорт проекта

Обоснование

1	Временные потери при согласовании текста новостей.
2	Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения.
3	Разностилевое оформление текстовой информации.

Паспорт проекта

Сроки

1. Согласование паспорта проекта 20.03.2023г. – 24.03.2023г.
2. Картирование текущего состояния (с 27.03.2021 г.- 14.04.2023г.)
3. Анализ проблем и потерь (с 17.04.2023г. – 26.04.2023г.)
4. Составление карты целевого состояния (с 27.04.2023– 02.05.2023г.)
5. Разработка плана мероприятий (с 03.05.2023г. – 19.05.23г.)
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с 22.05.2023г.–29.05.2023г)
7. Внедрение улучшений (с 30.05.2023г. –21.06.2023г.)
8. Мониторинг результатов (с 22.06.2023г. – 26.06.2023г.)
9. Закрытие проекта 27.06.2023г – 03.07.2023г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (03.07.2023г.– 05.07.2023г)


Введение в предметную область (описание ситуации «Как есть»)

Анализ проблем

Проблемы	Способ решения	Экономия времени
Длительный процесс подготовки информации	Печать текста в мессенджере	Сокращение ВПП (40 минут – 18 минут)
Избыточность информации	Разработка образца и алгоритма для подготовки новостей различного содержания	Сокращение ВПП (10 минут – 3 минут)
Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом	Возможность делать электронный вариант новостей на компьютере, телефоне, исходя из требований к техническим характеристикам файлов и изображений	Сокращение ВПП (30 минут – 15 минут)
Разностилевое оформление текстовой информации	Передача информации по электронной почте. Разработка шаблона для размещения информации на сайте учреждения (с ограничением редактирования и количества печатных символов)	Сокращение ВПП (15 минут - 3 минут)
Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения	Передача материалов по электронным формам связи	Сокращение ВПП (15 минут - 5 минут)

Картирование текущего процесса

на 27.03.2023 г.



ВАЖНО!
Картирование –
первый этап
формирования
бережливых проектов


The image features a blue 3D human figure standing next to a flowchart. The figure's right hand is pointing towards a diamond-shaped decision node in the flowchart. The flowchart consists of various geometric shapes (circles, rectangles, diamonds) connected by arrows, representing a process flow. The entire scene is enclosed in a pink border.

План мероприятий



№ п\п	Обоснование (проблема)	Причины	Планируемые мероприятия	Документ, подтверждающий выполнение работы	Ф.И.О., должность ответственного	Сроки
1	Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения	Занятость педагогов	Передача материалов по электронным формам связи	Утвержденный алгоритм передачи информации для размещения на сайте учреждения	Педагоги	02.05.2023г- 05.05.2023г
2	Избыточность информации	Отсутствие алгоритма подготовки информации	Разработка образца и алгоритма для подготовки новостей различного содержания	Утвержденный алгоритм передачи информации для размещения на сайте учреждения	Заведующая, старший воспитатель, педагоги	06.05.2023г- 10.05.2023г
3	Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом.	Отсутствие единых требований к техническим характеристикам файлов и изображений	Возможность делать электронный вариант новостей на компьютере, телефоне, исходя из требований к техническим характеристикам файлов и изображений	Утвержденный алгоритм подготовки информации на сайт учреждения	Делопроизводитель, старший воспитатель, педагоги	10.05.2023г- 15.05.2023 г.
4	Разностилевое оформления текстовой информации	Отсутствие общих требований к подготовке и оформлению материалов	Разработка шаблона для размещения информации на сайте учреждения (с ограничением редактирования и количества печатных символов	Утверждение шаблона для размещения информации на сайте учреждения (с ограничением редактирования и количества печатных	Заведующая, старший воспитатель, педагоги	03.05.2023г- 19.05.23г

Карта текущего состояния процесса

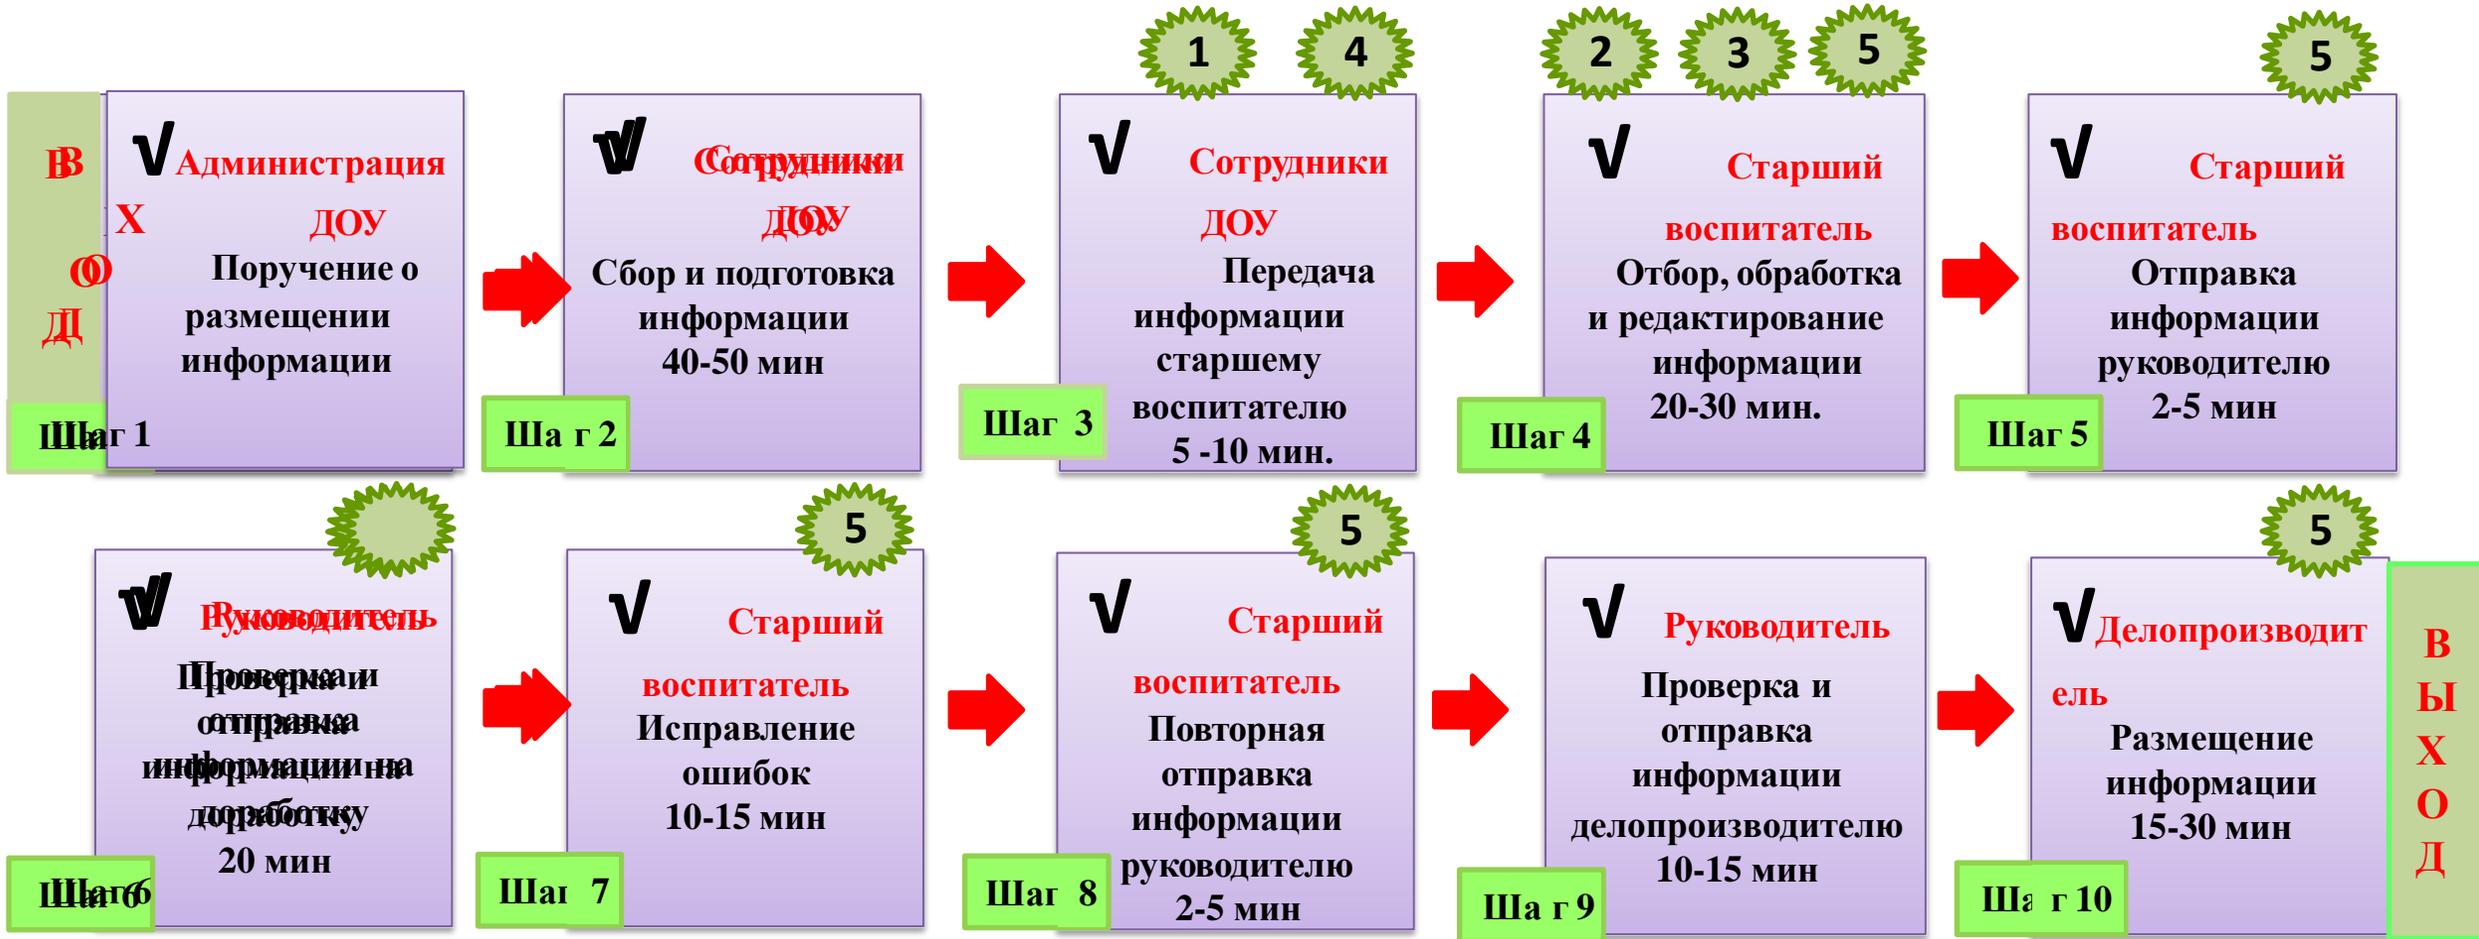

Избыточное количество информации

ВПП (время протекания процесса):

126 мин-185 мин

1 Разностилевое оформление информации, отсутствие структуры текста

2 Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом

3 Отправка информации разными мессенджерами

4

5

Проблемы, выявленные в ходе изучения проблемы

Министерство просвещения РФ

- Не выявлены

Министерство образования и науки Кузбасса

- Не выявлены

МБДОУ №39

- Длительный процесс подготовки информации.
 - Избыточность информации.
- Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом.
- Разнотипное оформление текстовой информации.
- Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения

Картирование целевого состояния процесса

27.04.2023–02.05.2023г



Карта текущего состояния процесса

В
Х
О
Д

✓ **Администрация**

ДОУ
Поручение о
размещении
информации
2-5 мин

Шаг 1



✓ **Сотрудники ДОУ**

Сбор и подготовка
информации
20-25 мин (по
разработанным
алгоритму)

Шаг 2



✓ **Сотрудники ДОУ**

Передача
информации
ответственному для
проверки
2-5 мин.

Шаг 3



✓ **Старший
воспитатель**

Отбор, обработка
и редактирование
информации
20-30 мин

Шаг 4



✓ **Старший
воспитатель**

Отправка
информации
руководителю

Шаг 5

✓ **Ответственный**

Проверка
информации,
корректировка и
отправка на проверку
руководителю
10-20 мин

Шаг 6



✓ **Старший
воспитатель**

Исправление
ошибок
10-15 мин

Шаг 7



✓ **Старший
воспитатель**

Повторная отправка
информации
руководителю
2-5 мин

Шаг 8



✓ **Руководитель**

Проверка и отправка
информации
ответственному для
размещения
информации
5-10 мин

Шаг 9



✓ **Ответственный**

Размещение
информации на сайте
и мессенджерах
5-10 мин

Шаг 10

В
Ы
ХО
Д

ВПП (время протекания процесса): 44 мин-75мин

Достигнутые результаты

До реализации
лин-проекта

После реализации
лин-проекта

ВПП (время протекания
процесса)
Минимум -126 мин
Максимум -185 мин

ВПП (время протекания
процесса)
Минимум – 44 мин
Максимум – 75 мин

Экономия времени
Минимум – 82 мин
Максимум – 110 мин

Достигнутые результаты

До реализации лин-проекта

- Длительный процесс подготовки информации
- Избыточность информации
- Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом
- Разностилевое оформление текстовой информации
- Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения

После реализации лин-проекта

- Вся информация передается по электронным формам связи
- Используются образцы, шаблоны и алгоритмы для подготовки новостей различного содержания на сайте учреждения и мессенджерах (с ограничением редактирования и количества печатных символов)
- Электронный вариант новостей формируется на компьютере, телефоне, исходя из требований к техническим характеристикам файлов и изображений
- Новости размещаются вовремя, без опозданий и задержки и с повышенным качеством содержания и стиля

Итоги мероприятий по устранению проблем




Сократили затраты времени практически во всех процессах

Сформировалась сплоченная команда по внедрению улучшений в процессе освещения деятельности дошкольного учреждения в сети Интернет, а также с целью создания единого информационного пространства для оперативного и конструктивного взаимодействия педагогов и



Достиженные результаты

До реализации

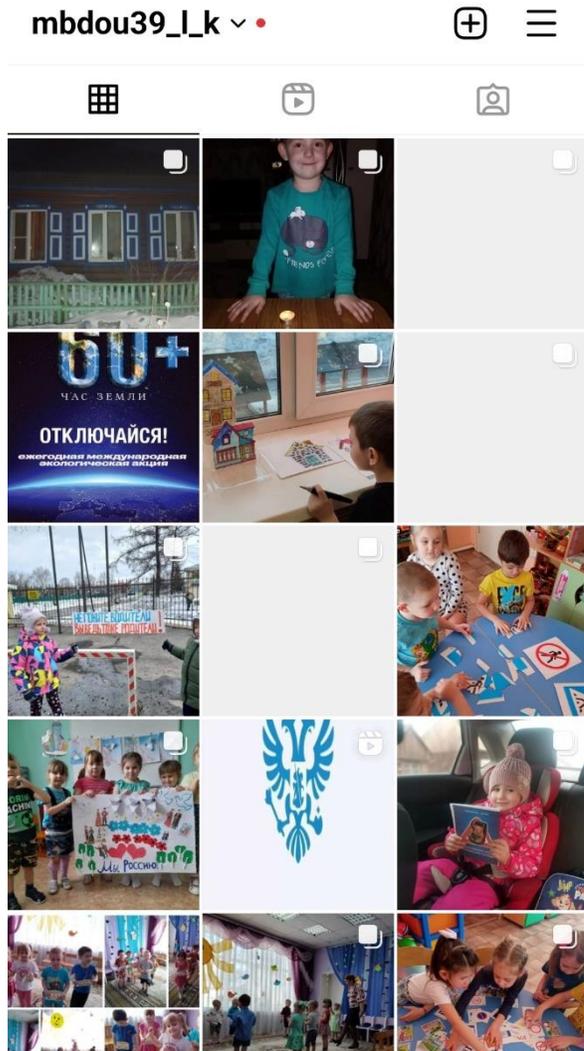

После реализации




Добро пожаловать!

Администрация и педагогический коллектив рады приветствовать вас на нашем сайте!
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №39» (МБДОУ №39)



Заведующий: Кутькина Ирина Леонидовна
Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Комбайнеров,2; пер. Комбайнеров,5
тел: 8(38456) 9-05-23,
э.почта: mbdou-39-2011@mail.ru
Наш сайт в первую очередь адресован тем, кто заинтересован в гармоничном и всестороннем развитии своего ребенка, кто готов поделиться опытом и рассказать о воспитании и обучении дошкольника.

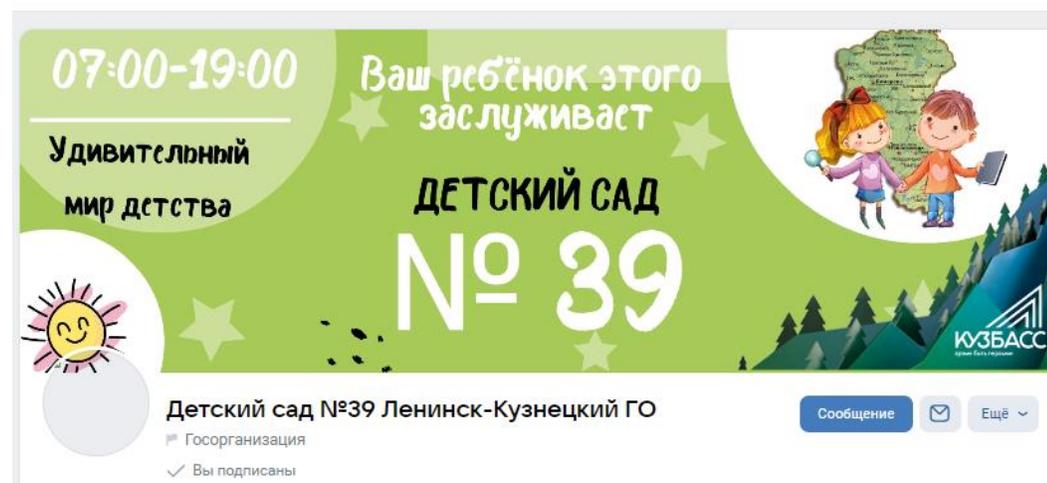

Детский сад №39
Ленинск-Кузнецкий ГО
Госорганизация • Дошкольное образование



Подтверждено через Госуслуги



Админ группы



Пригласить друзей



Информация о группе



Другие действия

117
Участники

948
Темы

0
Товары

3.7K
Фото

135
Видео

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение...

пер.Комбайнеров,2; пер. Комбайнеров,5, г. Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область)

Вся информация

Контакты

**652519, Кемеровская область -
Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий ГО,
пер. Комбайнеров, 2, 5
т. 8(38456) 90-5-22, 90-5-23
mdou-39-2011@mail.ru
<https://lenkuz39.tvoysadik.ru>**
